

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.



شركة
ساني العامرية
SANY Alameriah Co.





مكتب رمك للإستشارات الهندسية
RAMAK ENGINEERING CONSULTANTS OFFICE

من : FROM
شركة طرق الرياض للمقاولات المحدودة

المطور: شركة ساني العامرية

الى :
مكتب رمك للاستشارات الهندسية

مشروع تنفيذ اعمال البنية التحتية بمخطط تلال الغروب رقم ١٨٣٧ / ١ / س - جده
Block (1&3&5&10&11&12&13)

SUBMITTAL NO. :	24	NEW SUBMITTAL	☒	RE SUBMITTAL	☐	SUBMITTAL DATE : -	13-Dec.-2023											
TRANSMITTAL FOR :		METHOD STATEMENT	☒	CALCULATIONS	☐	CATALOGUE	☐	CERTIFICATE	☐	OTHERS	☐							
MATERIAL TEST		☐	TEST RESULTS	☐	SAMPLE	☐	DRAWING	☒	STRUCTURAL	☐	SCHEDULE P6	☐						
PROJECT MANAGEMENT	☐	EARTH WORK	☐	SEWAGE	☐	ELECTRICAL	☐	WATER	☒	CIVIL	☐	MECHANICAL	☐					
الموقع		BLOCK 10				ATTACHMENT :		☐										
NO.	NAME AND DESCRIPTION			MANUFACTURER / SUPPLIER			CONTRACT REF.		ACTION CODE									
1	المخطط التنفيذي لشبكة الإنارة Excutive Plan For Lighting Network BLOCK 10			شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.														
CONTRACTOR'S REMARKS				SIGNATURE التوقيع  Contractor PROJECT MANAGER م / أسامة النقيب														
INFRASTRUCTURE CONSULTANT COMMENTS :							SIGNATURE التوقيع  Consultant											
							PROJECT MANAGER  م / حسام محمد											
DEVELOPER PROJECT MANAGER COMMENTS :							Developer PROJECT MANAGER											
							م / علاء شلتوت											
							See Attachment ☒											

A = APPROVED B = APPROVED AS NOTED C = APPROVED AS NOTED, RESUBMIT E = DISAPPROVED F = NO ACTION

REF. IN :


REF. OUT:



المملكة العربية السعودية
أمانة جدة
الإدارة العامة للإشراف والتنفيذ

المخطط التنفيذي لشبكة الانارة
مخطط تلال الغروب - مدينة جدة

BLOCK 10



الأبنية للإستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers
هندسة . عمارة . تخطيط
Architects . Planners . Engineers

الاستشارى العام



شركة
ساني العامرية
SANY Alameriah Co.

شركة ساني العامرية



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

للتواصل : مدير المشاريع : 0544714479 الإدارة : 0566157166 info@ramakcompany.com


الاستشارى



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

المقاول

BLOCK 10

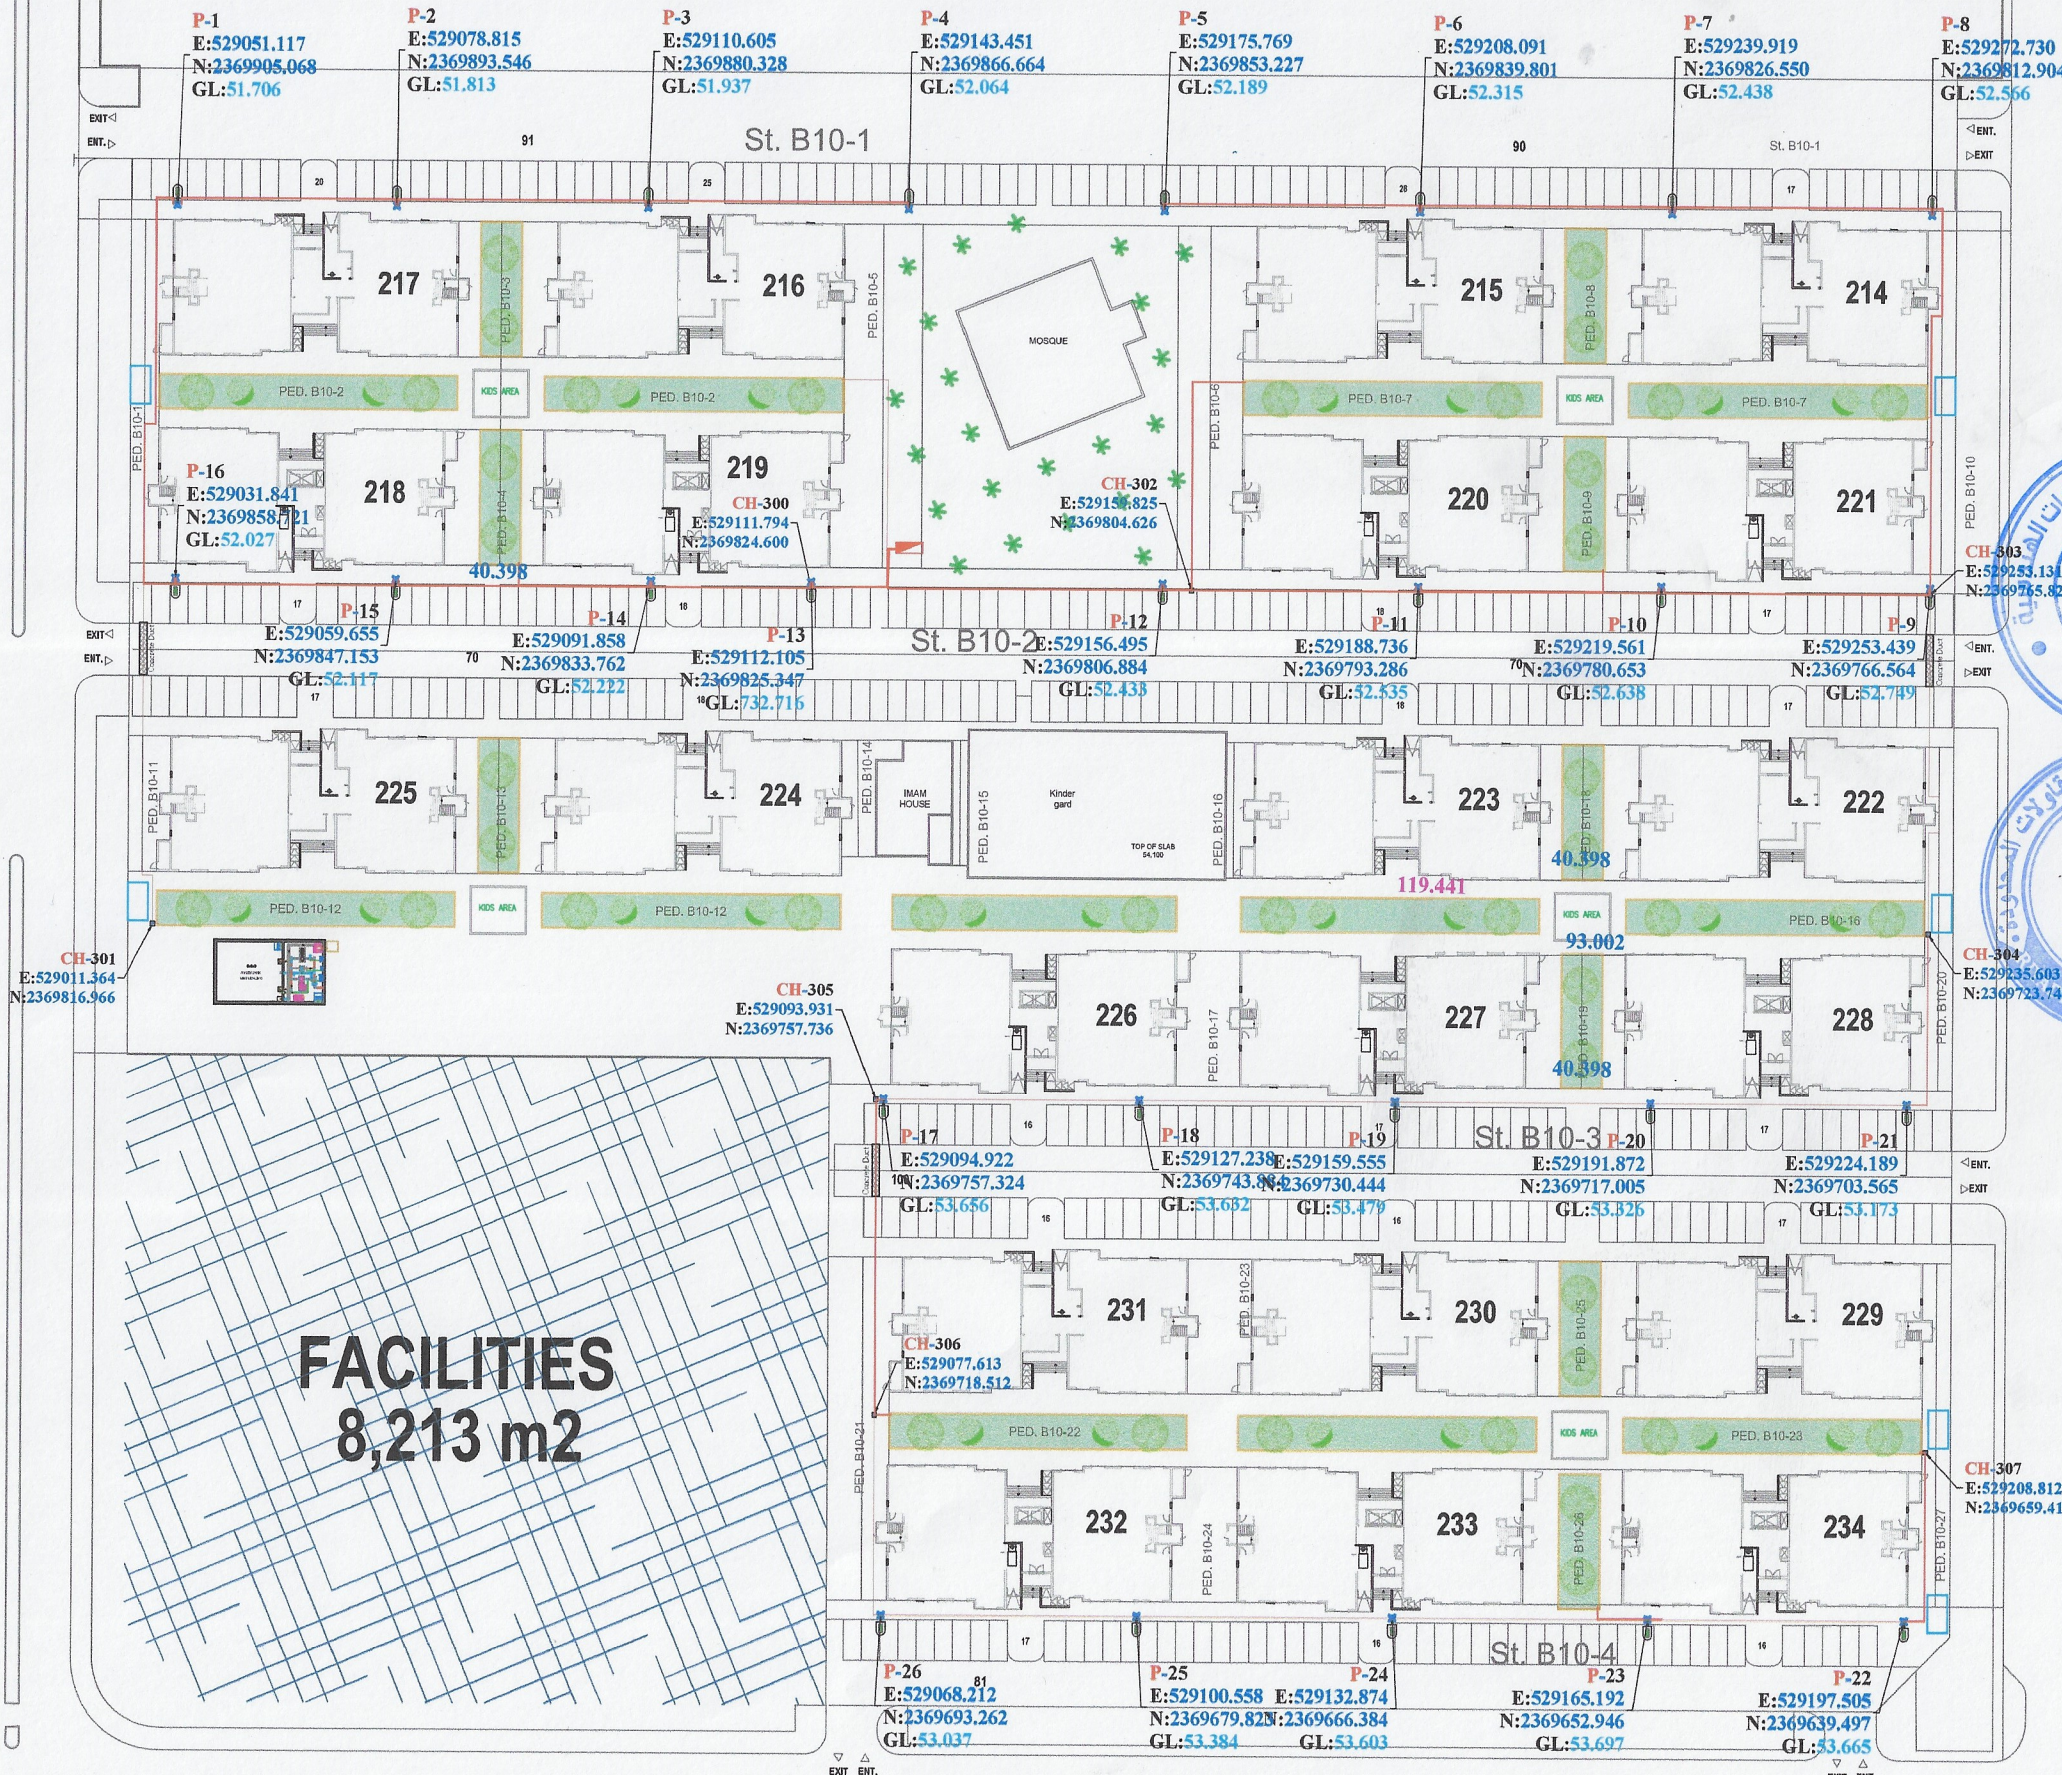

المملكة العربية السعودية
أمانة جدة
اداره العامة لاشراف والتنفيذ

المطور / شركة ساني العامرية
شركة
ساني العامرية
SANY Alameriah Co.

الاستشاري العام / الابنية للاستشارات الهندسية

الابنية للاستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers
هندسة - عمارة - تخطيط
Architects - Planners - Engineers

الاستشاري / مكتب رمك للاستشارات الهندسية

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - اشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
www.ramakcompany.com 0566321666 الجوال 0544714479

المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المفاتيح

المحطات		الرمز	العدد
لوحة اناارة (١٠٠ امبير) جهد ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت			١

الفيض الضوئي (ب٢)	الارتفاع	النوع	الرمز	العدد
٢٥٠	عمود ١٠ متر	مفرد		٣٦

الكابلات

الرمز	النوع	المقاس	الطول
	كابل مسلح XLPE	4x16mm2	١٥٢٥,١٠٧ متر

المخطط التنفيذي لشبكة الانارة
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N: PLAN

 شركة
سانى العامرية
SANY Alameriah Co.


 الأبنية للاستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers
 هندسة . عمارة . تخطيط
 Architects . Planners . Engineers

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المفاتيح

الكاملات[illegible]

P.N:	DATA
------	------

احداثيات اعمدة الآترة - مخطط تلال الغروب								
CENTER POLE					ارتفاع العمود / مفرد		التاريخ:	
					10.00		27/11/2023	
ROADS	POLE NO	EASTING	NORTHING	TOP ELEVATION	BOTTOM ELEVATION	CORNER NO	EASTING	NORTHING
ST B10-3	17	529101.646	2369754.528	53.6751	52.375	164	529101.835	2369754.070
						165	529102.104	2369754.717
						166	529101.457	2369754.985
						167	529101.189	2369754.335
						168	529129.535	2369742.550
ST B10-3	18	529129.346	2369743.008	53.6223	52.322	169	529129.804	2369743.197
						170	529129.157	2369743.460
						171	529128.889	2369742.819
ST B10-3	19	529166.280	2369727.648	53.4473	52.147	172	529166.468	2369727.191
						173	529166.737	2369727.837
						174	529166.091	2369728.106
						175	529165.822	2369727.460
						176	529194.168	2369715.671
ST B10-3	20	529193.980	2369716.128	53.3161	52.016	177	529194.437	2369716.317
						178	529193.791	2369716.586
						179	529193.522	2369715.946
						180	529221.869	2369704.151
ST B10-3	21	529222.160	2369704.609	53.1848	51.885	181	529222.137	2369704.797
						182	529221.491	2369705.066
						183	529221.222	2369704.420
						184	529195.185	2369640.082
ST B10-4	22	529194.996	2369640.540	53.6718	52.372	185	529195.454	2369640.729
						186	529194.807	2369640.890
						187	529194.338	2369640.353
						188	529167.486	2369651.606
ST B10-4	23	529167.298	2369652.064	53.6987	52.399	189	529167.755	2369652.252
						190	529167.109	2369652.521
						191	529166.840	2369651.875
						192	529139.788	2369663.130
ST B10-4	24	529139.599	2369663.587	53.6331	52.333	193	529140.057	2369663.777
						194	529139.410	2369664.043
						195	529139.141	2369663.399
						196	529102.856	2369678.495
ST B10-4	25	529102.668	2369678.952	53.4018	52.102	197	529103.125	2369679.141
						198	529102.479	2369679.410
						199	529102.210	2369678.763
ST B10-4	26	529074.969	2369690.476	53.1205	51.821	200	529075.158	2369690.018
						201	529075.427	2369690.665
						202	529074.780	2369690.933
						202		

احداثيات اعمدة الآلة - مخطط تلال الغروب								
CENTER POLE					ارتفاع العمود / مفرد		التاريخ:	
					10.00		27/11/2023	
ROADS	POLE NO	EASTING	NORTHING	TOP ELEVATION	BOTTOM ELEVATION	CORNER NO	EASTING	NORTHING
ST B10-1	1	529055.205	2369903.368	51.7215	50.422	100	529055.016	2369903.82
						101	529054.747	2369903.17
						102	529055.394	2369902.91
						103	529055.663	2369902.55
ST B10-1	2	529082.716	2369891.848	51.829	50.529	104	529082.716	2369892.30
						105	529082.448	2369891.65
						106	529083.094	2369891.39
						107	529083.363	2369892.03
ST B10-1	3	529110.605	2369880.328	51.9365	50.637	108	529110.417	2369880.70
						109	529110.148	2369880.13
						110	529110.794	2369879.87
						111	529111.063	2369880.51
ST B10-1	4	529147.539	2369864.969	52.0799	50.780	112	529147.350	2369865.42
						113	529147.081	2369864.76
						114	529147.727	2369864.51
						115	529147.996	2369865.15
ST B10-1	5	529175.286	2369853.431	52.1876	50.888	116	529175.088	2369853.86
						117	529174.829	2369853.24
						118	529175.475	2369852.97
						119	529175.744	2369853.62
ST B10-1	6	529212.219	2369838.070	52.3309	51.031	120	529212.030	2369838.52
						121	529211.762	2369837.86
						122	529212.408	2369837.61
						123	529212.677	2369838.25
ST B10-1	7	529239.919	2369826.550	52.4384	51.138	124	529239.731	2369827.00
						125	529239.462	2369826.36
						126	529240.108	2369826.05
						127	529240.377	2369826.73
ST B10-1	8	529267.619	2369815.030	52.546	51.246	128	529267.431	2369815.46
						129	529267.162	2369814.84
						130	529267.808	2369814.57
						131	529268.077	2369815.21
ST B10-2	9	529247.737	2369768.935	52.73	51.430	132	529247.926	2369768.47
						133	529248.195	2369769.12
						134	529247.549	2369769.39
						135	529247.280	2369768.74
ST B10-2	10	529219.561	2369780.653	52.6382	51.338	136	529219.749	2369780.19
						137	529220.018	2369780.84
						138	529219.372	2369781.11
						139	529219.103	2369780.46
ST B10-2	11	529195.894	2369790.495	52.5611	51.261	140	529196.083	2369790.03
						141	529196.352	2369790.68
						142	529195.706	2369790.95
						143	529195.437	2369790.30
ST B10-2	12	529170.503	2369801.055	52.4784	51.178	144	529170.691	2369800.59
						145	529170.960	2369801.24
						146	529170.314	2369801.51
						147	529170.045	2369800.86
ST B10-2	13	529110.439	2369826.034	52.2827	50.983	148	529110.628	2369825.57
						149	529110.897	2369826.23
						150	529110.250	2369826.45
						151	529109.981	2369825.84
ST B10-2	14	529085.048	2369836.595	52.203	50.903	152	529085.2364	2369836.13
						153	529085.5052	2369836.78
						154	529084.8589	2369837.05
						155	529084.5901	2369836.40
ST B10-2	15	529059.655	2369847.153	52.1173	50.817	156	529059.844	2369846.69
						157	529060.113	2369847.34
						158	529059.467	2369847.61
						159	529059.198	2369846.96
ST B10-2	16	529034.265	2369857.713	52.0345	50.735	160	529034.453	2369857.25
						161	529034.722	2369857.90
						162	529034.076	2369858.17
						163	529034.323	2369857.90

